

# COMUNE DI PIANEZZA

Provincia di Torino

PIAZZA Vittorio Veneto  
PIANEZZA (TO)

**PROGETTO DEFINITIVO**  
per il CONSOLIDAMENTO DI PIAZZA VITTORIO VENETO  
E SITO ADIACENTE  
Decreto Legislativo: 18 aprile 2016, n°50  
In attuazione della direttiva 2014-26-EU, 2014-24-EU, 2014-25-EU;

**Proprietà:**  
COMUNE DI PIANEZZA  
Via Roma, 10  
10138 PIANEZZA (TO)  
Tel. 011-4291112  
Email: [comune@comune.pianeZZa.to](mailto:comune@comune.pianeZZa.to)



DOCUMENTO redatto da:

**Ing. TULLIO MERO**  
Via Roma, 10  
10138 PIANEZZA (TO)  
Tel. 011-4291112  
Email: [ing.tullio.mero@comune.pianeZZa.to](mailto:ing.tullio.mero@comune.pianeZZa.to)  
Autografo e firma




SPAZIO A DISPOSIZIONE DELL'UFFICIO

TAVOLA: FASI E CANTIERE


Data: 02-05-2018

**ELABORATO**  
SIC-01


**FASE 0**  
OCCLUSIONE PER CIRCA 4,5 METRI DI VIA CADUTI  
DEMOLIZIONE FABBRICATO ED ACCESSO AL CORTILE INTERNO  
POSTO NEL RETO DELLA EX FARMACIA

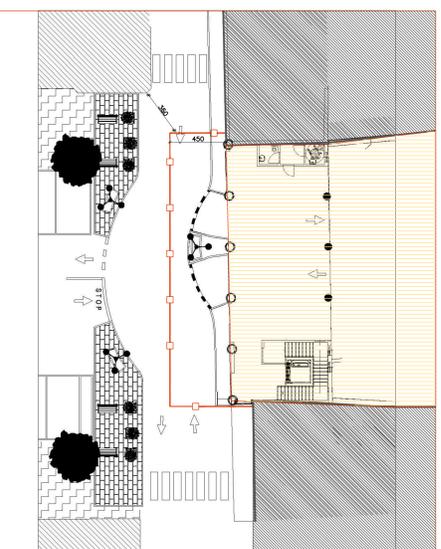


**FASE 1**  
REALIZZAZIONE MICROPALE INIZIO SCAVO CORTILE  
**FASE 2**  
REALIZZAZIONE RAMPA ACCESSO, SCAVO CORTILE E  
REALIZZAZIONE STRUTTURE PARCHEGGIO SINO A LINEA BLU

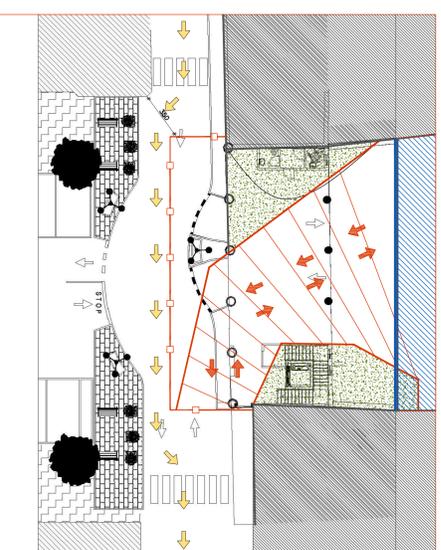


**FASE 3**  
AVVIAMENTO PER CIRCA 3,00 DELL'AREA DI CANTIERE PER  
PORTER COMPLETARE LO SCAVO SINO A CIRCA 3,5 METRI DAL  
FILO FABBRICATO EX FARMACIA. CHIUSURA VIA CAVOUR DA VIA  
GRAMSCI VERSO PIAZZA VITTORIO VENETO.

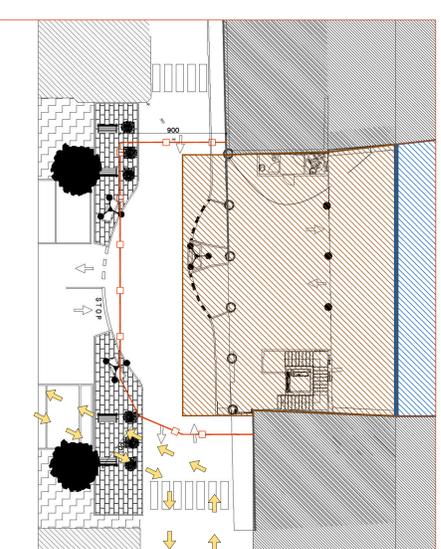


**FASE 5**  
REALIZZAZIONE PORTICATO

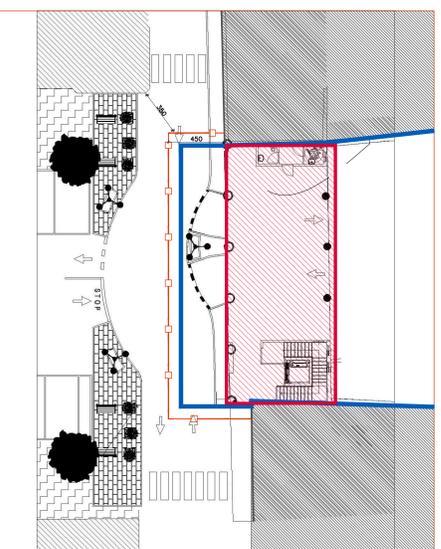

**FASE 6**  
APERTURA ZONA SUPERIORE NUOVO PARCHEGGIO E RELATIVA  
VIABILITÀ SU VIA CAVOUR E REALIZZAZIONE NUOVA RECINZIONE DI  
CANTIERE SU PIAZZA CAVOUR

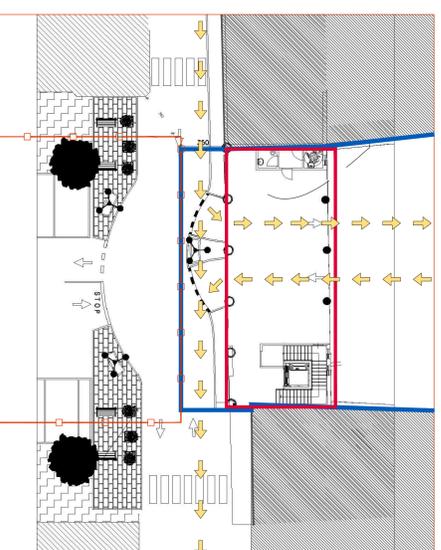

**FASE 7**  
SCAVO E COMPLETAMENTO PARCHEGGIO

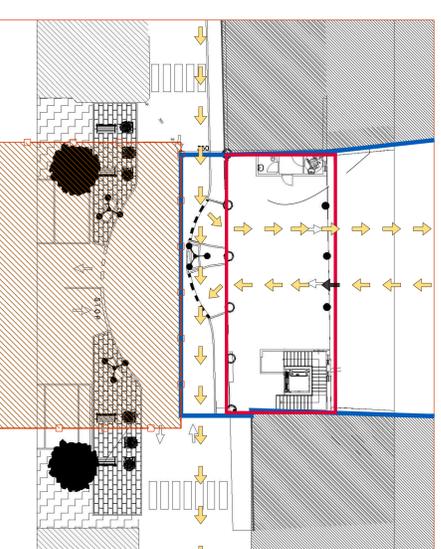

**FASE 4**  
FINITO LO SCAVO SU VIA CAVOUR L'AREA DI CANTIERE SI RIDUCE  
A CIRCA 9 METRI DAL FILO EX FARMACIA

